


노사 합동 안전 점검

현장명 : 강릉건소동 모아미래도 아파트 공사

2025년 2월 4일 화요일

보건관리자	안전관리자	안전관리자	안전보건 총괄책임자
방미림	강우성	박경근	

주요 점검항목	① 작업전 안전점검	② 안전통로확보
	③ 안전화, 안전모, 안전대 지급 착용	④ 전기기계기구에 누전 차단기 설치
	⑤ 위험기계, 기구등에 방호장치 설치	⑥ 중량물 낙하 위험구역내 접근 금지
	⑦ 밀폐공간 작업시 2인1조 작업실시	⑧ 안전난간, 개구부 덮개 설치
	⑨ 용접시 인화성물질 격리	⑩ 굴착 작업전 작업지반 조사 실시
	⑪ 작업후 정돈	⑫ 건설기계 이동시 유도자 배치
	⑬ 화재예방 점검	⑭ 밀폐공간 작업전 복합가스농도 측정실시

노사 합동 점검 표

점검 항목	점검 사항	점검 결과	조치 사항
굴착 작업	1. 지반상태 - 비탈면 및 비탈상부 이상유무 - 인접 지반 균열상태	특이사항없음	계속적 관리중
	2. 굴착 사면 안전조치 상태 - 경사면의 기울기 기준 유지 여부 - 측구등 배수로 설치 - 경사면 빗물 침투 방지 조치	특이사항없음	계속적 관리중
	3. 흙막이 지보공의 설치 상태 - 재료 및 이음부위 이상유무 - 토류벽의 변위 이상유무 - 복공판 설치 상태	볼팅, 용접 계속적 관리필요	보수 가능한 부분 볼팅 및 용접실시
	4. 부석으로 인한 낙반, 붕괴 위험에 대한 조치 상태	이상없음	
	6. 굴착면 인접부의 중량물 및 토사 적치 여부	이상없음	
	7. 계측 관리 여부	이상없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
거푸집 및 거푸집동바리	1.구조 검토 실시 여부 2.조립도의 작성 및 준수 3.콘크리트 타설에 대한 안전 - 변형,변위 유무 - 작업 지휘자 배치 4.거푸집 동바리 - 깔목 사용등 침하 방지 조치 - 높이 조절용 핀의 전용핀 사용 - 경사지에 췌기목설치등 미끄럼 방지 조치 - 수평연결재 설치 여부(3.5M초과시 2M 이내마다 설치) - 동바리 수직도	이상없음 이상없음 특이사항 없음 미도래 미도래	작업실시(신호수 배치, 근로자동제) 아웃트리거 및 깔판설치 & 작업지반 조사
추락재해 방 지	1.개구부 방호조치 - 엘리베이터 홀, 바닥 개구부 안전난간, 덮개 설치 여부 - 베란다, 통로, 작업 발판끝 안전 난간 설치 여부 - 기타 개구부 방호 조치 여부 2.비계의 설치 상태 - 시스템비계 설치여부 - 외줄 비계 조립시 작업 발판 3.이동식(틀) 비계 여부 - 상부 안전난간 설치 여부 - 사다리등 승강 설비 설치 여부 - 바퀴 구름방지 장치 설치여부 4.안전난간을 설치할수 없는 개구부 주위 고소 작업시 안전대 부착 설비 설치, 안전대지급 착용상태	특이사항 없음 특이사항 없음 미도래 특이사항 없음	플라스틱 개구부 덮개 파손위험으로 난간대, 유공발판 등으로 계속적 관리중 안전대 부착설비 설치 및 근로자 안전대 착용 및 안전고리체결 관리중

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
추락재해 방 지	5.작업발판의 폭,고정 상태 6.가설통로의 폭, 접속부의 연결, 미끄럼방지 조치, 표준안전난간 설치 여부 7.이동식사다리, 가설계단의 적정설치 여부 8.작업장내 작업통로의 확보 및 안전통로 상태 9.개인 보호구의 지급.착용 상태 10.계단 선단부 안전난간설치 - 안전난간 견고성 - 사용 재료 적합성	특이사항 없음 보행자통로주변 협소 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	보행자통로에서 휴게실 올라가는 구간 자재구획설정 및 통로확보
낙하재해 방 지	* 낙하물 방지망 - 망의 설치 여부 - 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정 여부 - 망의 파손 및 오물 적치 상태 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 리프트 주변 방호선반 설치 여부	작업미도래	
감전재해 방 지	1.이동식 전기기계, 가구 - 접지 상태 및 접지형 작업선 사용 및 배치 상태 - 감전 방지용 누전차단기 설치 및 작동 상태 - 이동식작업등 접지 및 보호카바	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
감전재해 방 지	2.분전반, 임시 배전반 - 누전 차단기 설치 여부 - 충전부 방호 여부 - 퓨즈의 적정 여부 3.이동전선 - 피복 손상 상태 - 배선경로 및 상태 - 접속 상태 - 임시전등의 안전상태 - 물기와 이격 상태 4.교류 아크 용접기 - 접지의 적정여부 - 충전부 노출 여부 - 자동 전격 방지기 설치 여부 5.불량 전기기계 사용 여부	특이사항 없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	지면에서 이격 계속적 관리중
위험기계기구 재해방지	1.위험기계기구 검사등 - 완성. 정기검사 여부 - 안전검사 실시 여부 2.건설용 리프트의 이상여부 3.타워 크레인의 이상여부 4.고속절단기 방호 장치 5.전기용접기의 전격방지기설치여부 6.기타 위험기계기구의 이상여부	이상없음 이상없음 작업미도래 5호기 설치됨 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	
차량계 건설기계	1.전도방지를 위한 안전조치여부 2.작업경로의 적정성 여부 3.주용도 이외의 다른 용도로 사용 하는지 여부 4.유도자 배치 여부 5.기타위험사항	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 롤러 고임목 미실시	지반 연약시 천공기 철회설치하여 관리 신호업무자 안전모 (빨간색) 착용관리 고임목 설치관리 실시

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
기타 사항	1.근로자 안전모 착용 상태	이상없음	바람이 많이불면 눕혀놓는등 조치실시
	- 턱끈 사용 상태	이상없음	
	2. 안전표지판등 설치 상태	양호함	
	3. 현장주변 정리정돈 및 통로확보 상태	양호함	
	4. 임시소방시설 설치 및 작동 여부	이상없음	
	5. 안전통로 관리상태 이상여부	이상없음	
	6. 고소작업대(렌탈)이상여부	작업미도래	
7. 기타사항			
	- 소화기 배치상태	적정함	
	- 차량계건설기 반입 및 사용시 점검		
	- msds관리상태	고체연료 사용시 전도방지 철저	고체연료 거치대 사용하여 관리중














중 합 평 가

1. 현장 정리정돈 및 보행자통로 확보 계속적 관리필요
2. 현장내 근로자 협착위험 있음만한 기계 및 자재는 고임목 조치실시
3. 강풍피해 현황 조사 및 보수관리 (작업현황판 등)
4. 고체연료 사용시 전도방지 및 작업종료후 회수 및 정리정돈 철저
5. 자재하차시 현장내 신호수 신호준수 및 평지에서 하차실시
6. 현장내 쓰레기 분리수거 할수 있도록 관리필요

노사합동정검 참석자명단

현장명 : 강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사

2025년 2월 4일

참여자 명단		
업 체 명	성 명	확 인
㈜미래도건설	윤 승 현	
㈜미래도건설	임 건 영	
㈜미래도건설	박 노 지	
㈜미래도건설	김 창 근	
육삼건설(주)	이 항 우	이 항 우
육삼건설(주)	김 석 진	
㈜리도건설	안 진 성	
㈜리도건설	최 규 원	
신화하이테크(주)	한 지 원	
신화하이테크(주)	최 재 로	
비경건설(주)	관 건 철	
비경건설(주)	장 연 수	
㈜씨엔지건설	김 학 수	김 학 수
㈜씨엔지건설	이 성 훈	
㈜미래도건설	방 미 경	방 미 경
㈜미래도건설	강 우 생	강 우 생
㈜미래도건설	박 철 근	

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 02월 04일 화요일

공 종 : 토 공사

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	○		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	○		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	○		배치수량 : 6개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	X			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	○		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	○		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	○		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	○	○		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	○		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	○		
	10. 커팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	○		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리мит :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	X			

강릉건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 옥삼건설

사업주(현장소장) 전 호 석

근 로 자 양 석 진

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)


2025년 02월04일

공 종 : 가시철

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	○		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	○		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	○		배치수량 : 21
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	X			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	○		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	○		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	○		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	○	○		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	○		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	○		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	○		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	○	○		높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	X			

강릉건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 (주)리도건설
 사업주(현장소장) 이 종 민
 근로자 최 규 원



합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 02월 04일 화요일

공 종 : 지 반 개 량



구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	0	0		
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	0	0		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	0	0		배치수량 : 12개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	0	0		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부?	0	0		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부?	X			
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	0	0		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	0	0		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	X			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	0			
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	0			
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부?	0			
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	0			
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 돌비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	0	0		경력 : 5년
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	0	0		
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	0	0		

강릉건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 신화하이테크

사업주(현장소장) 최 장 열

근 로 자 류재호

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 02월 04일 화요일

공 종 : 기 계 설 비

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	○		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	○		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	○		배치수량 : 3
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	○	○		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	○		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	○		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	○		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	○	○		
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	○	○		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	○	○		
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	○		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	○		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	○	○		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	○		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리мит :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?		○		

강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 씨엔지건설

사업주(현장소장) 이 상 택 *이상택*

근 로 자 이 성 춘 *이성춘*

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 02월 04일 화요일

공 종 : 골 조

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	0	✓		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	0	✓		배치수량 :
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	0	✓		
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	X			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	0	✓		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	0	✓		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	0	✓		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	0	✓		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			주로프 : 보조로프 :
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	X			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	0	✓		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	0	✓		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	0	✓		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	0	✓		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	0	✓		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	0	✓		높이 : 폭 : 400
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	0	✓		
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	0	✓		

강릉 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 비경건설(주)
 사업주(현장소장) 안 건 철
 근 로 자 강 인 수

사진대장



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		

사진대장



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		

사진대장




일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(롤러 고임목 설치관리)		



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(방치된 유류 보관소로 이동실시)		

사진대장

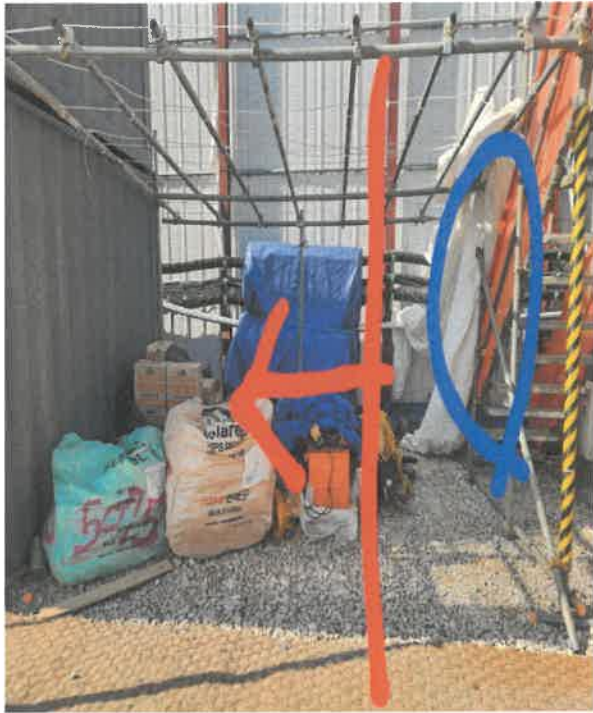

일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(보행자통로 주변 자재구획정리 및 통로확보)		



일자	2025 년 2 월 4 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(자재 구획정리 실시)		
