

노.사 안전보건 협의체 회의				보 건	안 전	소 장
				방미경	강우남 의결권	
일 시	2025년 5월 29일 목요일		회의시간	13:40~15:00		회의장소
참석인원	계	16 명	사용자	8 명	근로자	8 명
전 회 협 의 체 미 결 사 항						
1. 전회미결사항없음.						
순 번	협 의 내 용					
1	- 사업장의 산업재해예방계획의 수립에 관한사항					
2	- 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한사항					
3	- 근로자에 대한 안전보건교육에 관한 사항					
4	- 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한사항					
5	- 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항					
6	- 중대재해 원인 조사 및 재발방지 대책 수립에 관한사항					
7	- 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에관한사항					
8	- 유해하거나 위험한 기계.기구 설비를 도입한 경우 안전 및 보건관련 조치에 관한사항					
9	- 전 공정 위험성평가 및 수시 위험성평가등에 관한 사항					
10	- 그 밖에 해당 사업장 근로자의 안전과 보건을 유지.증진시키기 위하여 필요한 사항					
11	- 산업재해 예방방법 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법					
12	- 작업의 시작시간,작업 및 작업장 간의 연락방법					
13	- 그 밖의 산업재해 예방과 관련된 사항					
14	- 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정					
공통사항	1. 노.사협의체회의 / 위험성평가[05월29일(목)13:40~15:00]					
기타 건의사항	1. 지정병원:강릉동인병원 (033-650-6105) 2. 배치전/특수건강검진:예수강릉메디컬의원 직업환경의학과(033-655-9225) 3. TBM시간 조정					

회의 안건 심의 및 진행 사항

심의. 의결 안건	토의결과
1. 안전교육등 전달사항	1. 현장 정리정돈 및 재떨이 일반쓰레기 분리 (모래넣기)
	2. 보행자 통로 확보 (휴게실 계단 등)
	3. 근로자 협착위험 있는 기계 및 자재 전도방지조치
	4. 일일 서류 담당자 지정 및 당일관리 철저
(식염포도당,휴게실관리,온열민감군관리,체감온도 스티커부착)	5. 여름철 온열질환 대비철저 (산업안전보건기준 관한 규칙 전파)
*제빙기는 6월초에 설치예정	6. MSDS 대상물질 소분용기시 경고표지 부착 必(펌프카포함)
	7. 현장내 차량 경사면에서 하역금지 (평지에서 하역)
	8. 레미콘, 자재하역운반 건설기계 등 10km 서행준수
	9.위험물 저장소 보관소 관리철저
	1)경고표지외 물질안전보건자료 비치 필요
	2)전도방지 조치 필요, 소화기 설치
	3) 외부 잡자재 별도보관
	10. 용접시 보호구 관리철저, 소화기비치 2개이상
	11. 환경·민원예방관리 철저
	1) 콘크리트 타설시 페 콘크리트 담을 박스 배치 등 관리
	2) 소음발생 작업시 에어방음벽 설치 & 8시 이전
	소음작업지양 등 소음 저감을 위해 노력할 것
	3) 톱다이 비산방지조치 (집진기 설치 등), 보호구착용 必
	4) 콘크리트 타설 전·중·후 양수관리 철저
	(콘크리트 물 배출수에 혼입되지 않도록 관리 철저)
	13. 화재예방철저, 화재예방 점검표 일일점검 준수
	14. 종이 파지 보관함에 버릴것
2. 전월 노사협의체 Feed Back	1. 전 근로자 대상 2진 아웃제 도입중으로 경고1회후
	2회 적발자는 현장퇴출 할 예정임을 다시 공지합니다.

3. 심의 및 의결결과	1.여름철 온열질환 대비 관련품목 산안비적용
	※산안비 총액 10%내에서만 가능
	- 체감온도 31도 이상시 온열질환예방 이벤트
	EX) 워터걸, 워터보이, 아스크럼데이, 수박데이 등
	- 찬성 (16) 명, 반대 (0) 명
4. 근로자 의견	

참 석 자 명 단(노사협의체)

현장명 : 강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사

2025년 5월 29일

사용자 위원			근로자 위원		
업 체 명	성 명	확 인	업 체 명	성 명	확 인
(주)미래도건설	임진영		(주)미래도건설	유관국	
(주)리도건설	한천성		(주)리도건설	A 강성욱	
옥삼건설(주)	전호석		옥삼건설(주)	이태민	
비경건설(주)	유명학				
씨엔지건설(주)	김학우	김학우	씨엔지건설(주)	이성훈	
(합)현대쌍생량사	리관훈	리관훈			
(주)4노연시비업	이정록				
(주)미세로건설	윤승현		(주)미세로건설 안전감시관	김병석	
			4노연시비업	김부진	
			현대쌍생량	김진우	
			비경건설(주)	유명석	
간 사	박철근	박철근			
	강우성	강우성			
	방미림	방미림			

사 진 대 장



일자	2025 년 5 월 29 일	장소	안전교육장
내 용	5월 노사안전보건협의체 회의		



일자	2025 년 5 월 29 일	장소	안전교육장
내 용	5월 노사안전보건협의체 회의		

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 20일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
무너짐

‘25년 5월 19일(월) 09:34경 경북 포항시 소재
수해지역 복구공사 현장에서 재해자가 흙막이
가시설 설치 작업 중 **무너진 토사에 깔려 사망**



예방대책



- 작업 시작 전 작업장소에 대한 지층의 상태, 함수·용수 등의 이상유무를 점검합니다.
- 흙막이가시설(토류판) 설치는 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위에서 신속하게 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 20일 17:00


중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
떨어짐



‘25년 5월 16일(금) 14:50경 강원 강릉시 소재
건축공사 현장에서 재해자가 비계로 이동 중
건물 외벽과 비계 사이로 떨어져(3m) 사망

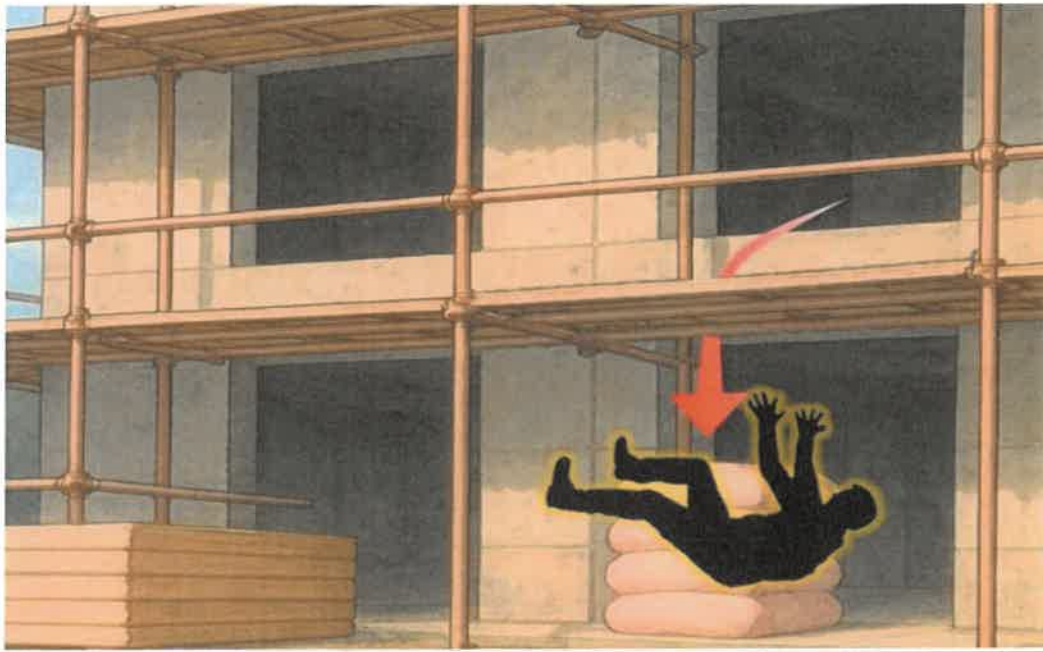

예방대책



- 가설통로의 단부에는 추락 방지를 위한 안전난간을 설치합니다.
- 안전난간 설치가 곤란한 경우 비계와 벽면 사이 개구부에는 추락방호망을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 28일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
떨어짐



‘25년 5월 26일(월) 15:18경 경남 거제시 소재 학교 건축공사 현장에서 재해자가 계단으로 내려오던 중 **계단 측면으로 떨어져(11m) 사망**



예방대책



- 계단의 개방된 측면에는 규격에 맞는 안전난간을 설치합니다.
- 작업으로 인해 임시로 난간등을 해체해야 하는 경우에는 추락방호망 설치 등 추락방지조치를 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 28일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
떨어짐



‘25년 5월 27일(화) 10:10경 경기 파주시 소재 아파트 건설공사 현장에서 재해자가 자재반입 작업 중 **바닥으로 떨어져(3.5m) 사망**



예방대책



- 단부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간, 울타리 등을 설치합니다.
- 작업 여건상 난간 설치가 어려운 경우, 반드시 안전대 부착 설비를 설치하고 안전대를 체결한 후 작업합니다.



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
부딪힘

‘25년 5월 23일(금) 08:30경 경남 밀양시 소재 토목공사 현장에서 재해자가 상차 작업 후 밀려 내려오는 덤프트럭에 부딪혀 사망



예방대책



- 차량계 건설기계 운전자가 운전 위치 이탈 시 원동기 정지 시키고 브레이크를 확실히 거는 등의 조치를 합니다.
- 경사면에 주차 시 바퀴에 고임목을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 5월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
제조업

발생형태
부딪힘

‘25년 5월 23일(금) 09:19경 전남 영암군 소재
선박부품 제조 사업장에서 재해자가 이동 중
운행하는 **지게차와 부딪혀 사망**



예방대책



- 작업 장소 이동 시 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 보행자 안전통로를 설치합니다.
- 지게차 운행 시 현장 상태에 적합한 제한속도를 정하고, 운전자로 하여금 제한속도를 준수하여 주행하도록 합니다.
