

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 3일 16:00

중대재해
사이렌



건설업

'25년 1월 31일(금) 15:30경 충북 청주시 소재 도로
확포장공사 현장에서 굴착기로 철판 운반 중 **철판이
넘어지며 재해자가 깔려 사망**



예방대책



- 굴착기를 사용하여 화물 인양 작업 시 해지장치가 설치된 달기구를 사용하고, 인양물과 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 4일 17:20

중대재해
사이렌



건설업

'25년 2월 3일(월) 10:47경 경기 평택시 소재 공연장
신축공사 현장에서 재해자가 고소작업대에 올라 작업 중
5.1m 아래 바닥으로 떨어져 사망

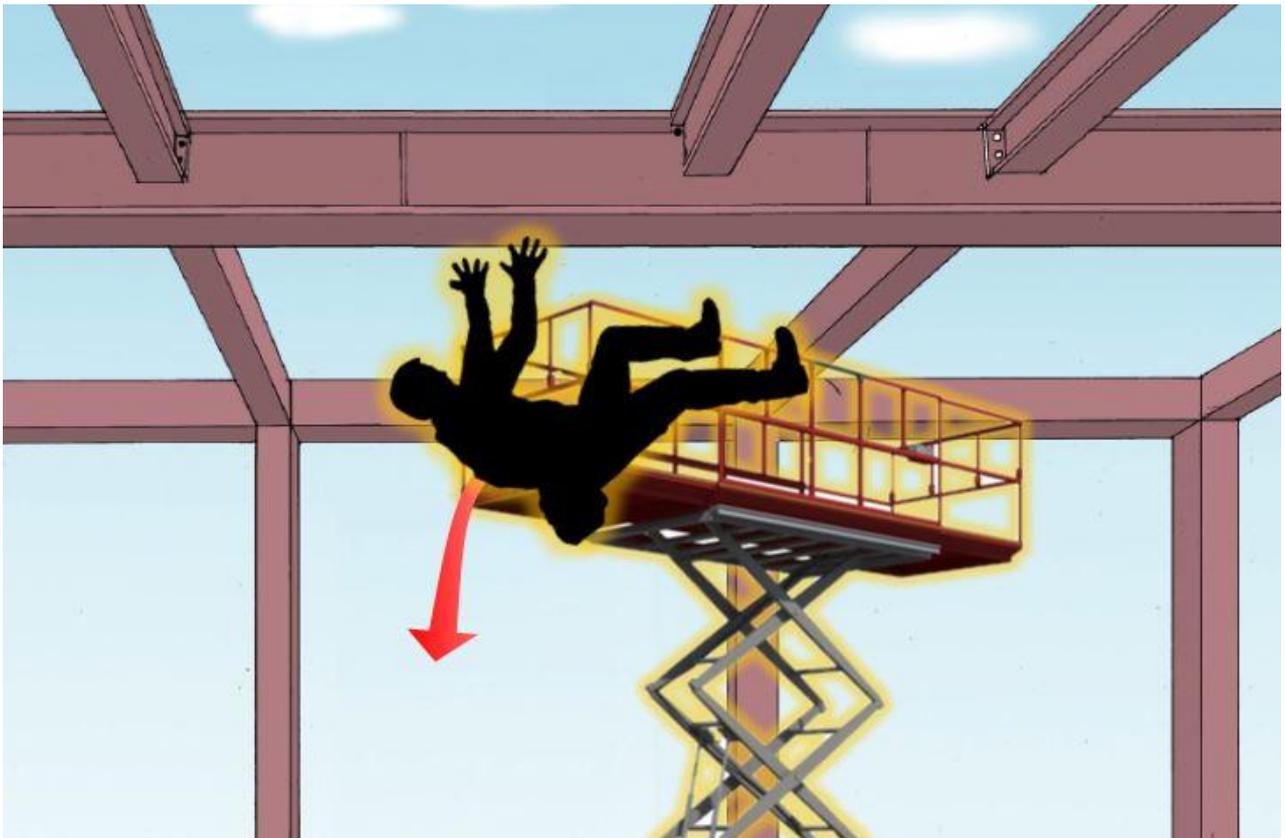

예방대책



- 안전모·안전대 등 보호구를 착용하고, 작업대의 안전난간에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 6일 15:00

중대재해
사이렌



건설업

'25년 2월 3일(월) 10:10경 대구 동구 소재 사옥 증축
신축공사 현장 철골 위에서 재해자가 볼트 체결 작업 중
4.9m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 사망

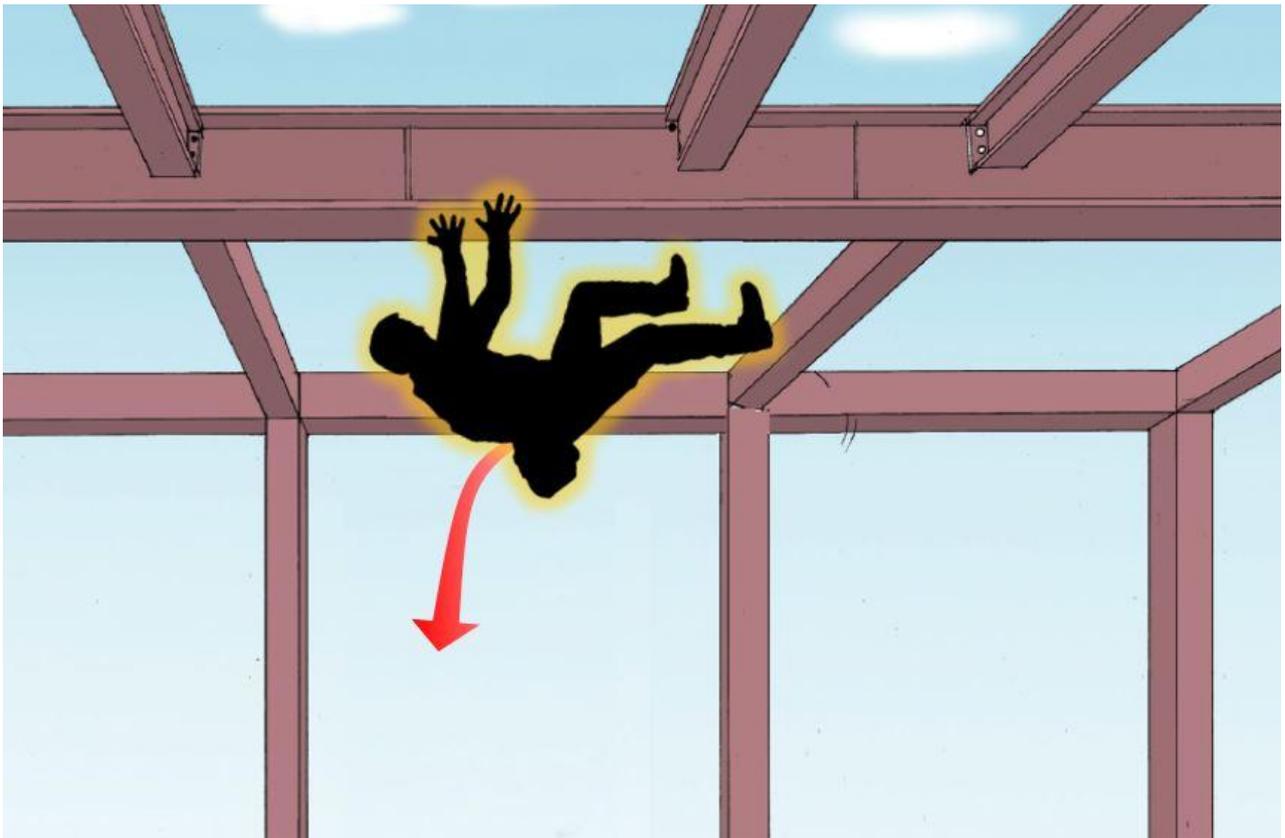

예방대책



- 철골 구조물 위에서 작업 시 추락방호망을 설치하거나, 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치 후 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 7일 15:10

중대재해
사이렌



건설업

'25년 2월 6일(목) 11:24경 경북 경주시 소재 폐수
자원화시설 설치현장 철골 위에서 이동 중인 재해자가
6.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 안전시설(안전난간, 망 등)을 설치하되, 작업 특성상 설치가 곤란한 경우 안전대 부착 설비를 설치하고 근로자에게 개인 보호구(안전대, 안전모)를 지급 착용하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 7일 15:40

중대재해
사이렌



건설업

'25년 2월 6일(목) 13:43경 경남 하동군 소재 태양광 설치공사 현장에서 재해자가 지붕 위 작업 중 채광창이 깨지며 **10m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대 부착 설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 12일 13:20

중대재해
사이렌



건설업

'25년 1월 24일(금) 15:30경 경기 부천시 소재 오피스 신축공사 현장에서 재해자가 **틀비계에 올라 작업 중 2m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 사망**

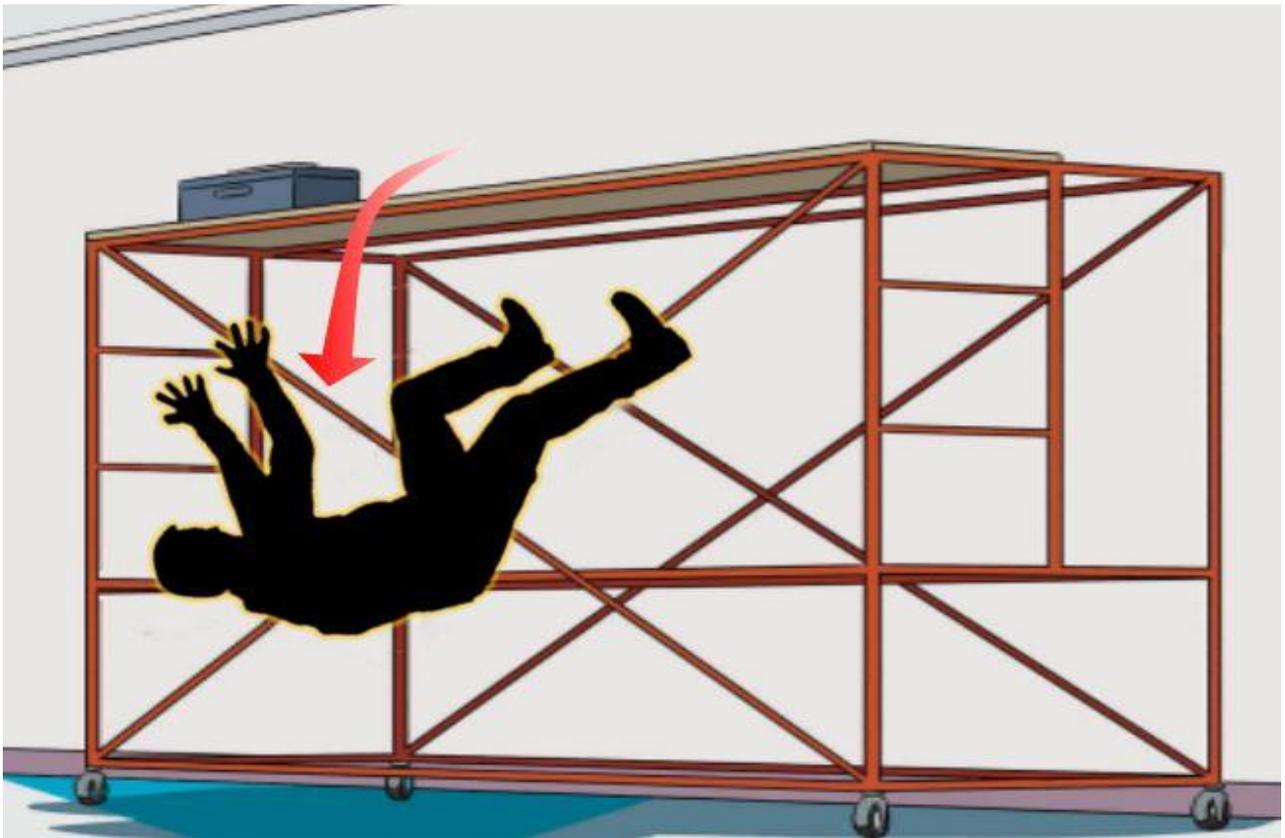

예방대책



- 이동식 틀비계 최상부에서 작업을 하는 경우 안전간판을 설치하고 안전대를 착용·체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 12일 17:20

중대재해
사이렌



건설업

'25년 2월 11일(화) 08:40경 충남 당진시 소재 건식소화 설비 설치공사 현장에서 재해자가 **철골 설치 작업 중 13m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락방호망 및 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자에게 안전대를 지급·체결하도록 교육 후 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 13일 09:30

중대재해
사이렌



건설업

'25년 1월 18일(토) 12:06경 전남 영암군 소재 지붕 개량공사 현장에서 재해자가 작업 중 **채광창이 깨지며 4.5m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 사망**



예방대책



- 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치한 후 작업을 실시합니다.
- 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용·체결하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 02월 18일 09:30

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해유형
화재



사고 개요


2025. 2. 14.(금) 10:51분경 부산시 기장군 소재 0000신축공사 현장에서 인테리어 등 마감공정 작업 중 화재발생. 사망 6명 등 다수의 인명피해 발생

재해 사진



용접·용단 작업 등 화재·폭발 재해예방 안전대책

대책1

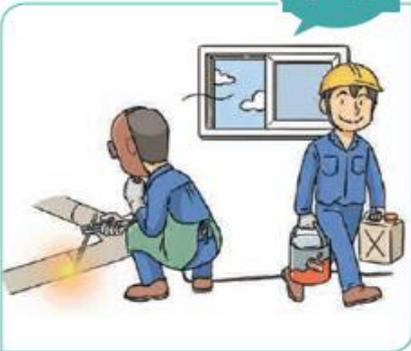

환기·가연물 제거

대책2



불티비산 방지조치

대책3



화재감시자 배치

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 18일 10:30

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
부딪힘

'25년 2월 13일(목) 14:08경 서울 노원구 소재 체육센터 공사 현장에서 **철골 상부에 앉아 철골 설치작업 중 인양하던 철골부재에 맞아 사망**



예방대책



- 철골부재 인양 작업 시 신호수를 배치하여 신호에 따라 안전하게 작업하며, 매달린 물건의 하부에서 작업을 하지 않도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 18일 13:30

중대재해
사이렌

업종


건설업

재해 유형

갈림·뒤집힘

‘25년 2월 14일(금) 09:43경 경북 경산시 소재
저수지 정비공사 현장에서 **지수벽* 거푸집 해체
작업 중 넘어지는 지수벽에 깔려 사망**

* 지수벽: 땅 속 또는 지표의 물을 차단하거나 투수성을 저하시키기 위한 벽

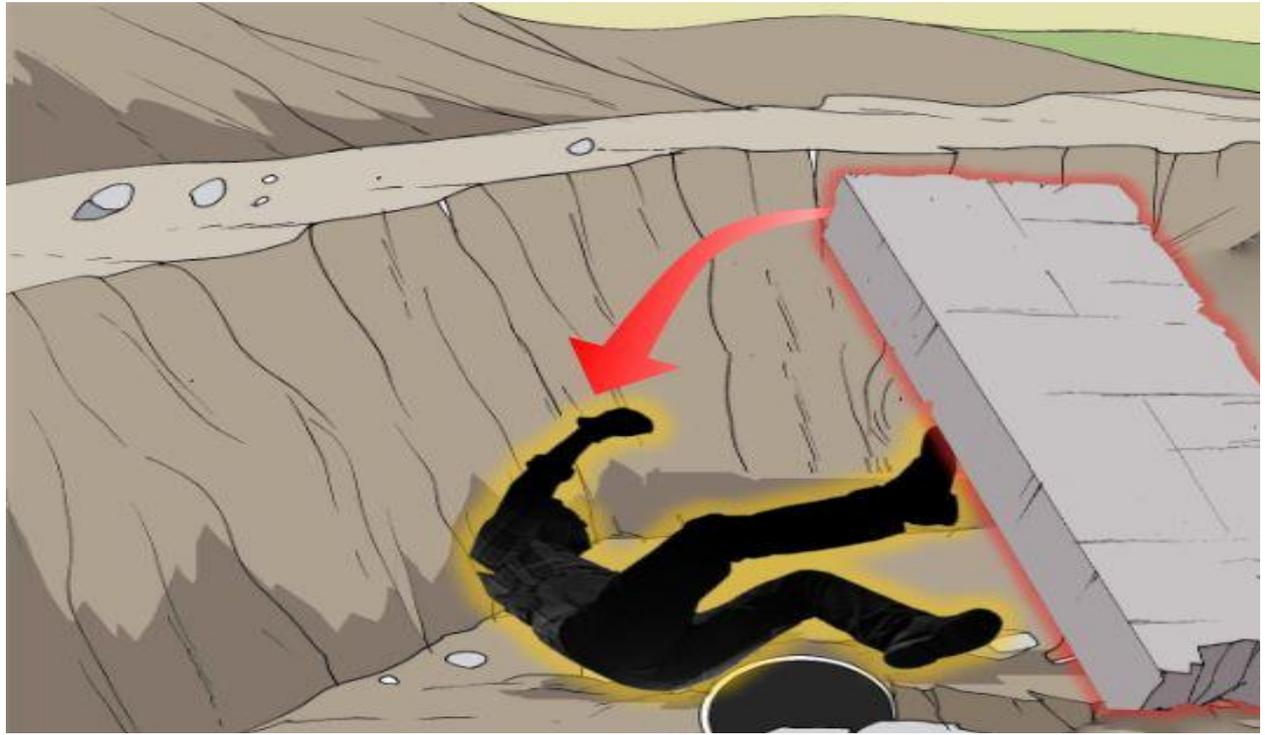

예방대책



- 설치한 지수벽이 충분한 강도를 갖도록 콘크리트 양생기간을 준수하고 올바른 거푸집 및 동바리의 제거시기와 순서에 맞춰 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 18일 15:45

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 14일(금) 11:12경 경기 양주시 소재 물류 센터 신축공사 현장 단부에서 재해자가 자재를 아래로 내리던 중 **5m 아래 바닥으로 떨어져 사망**

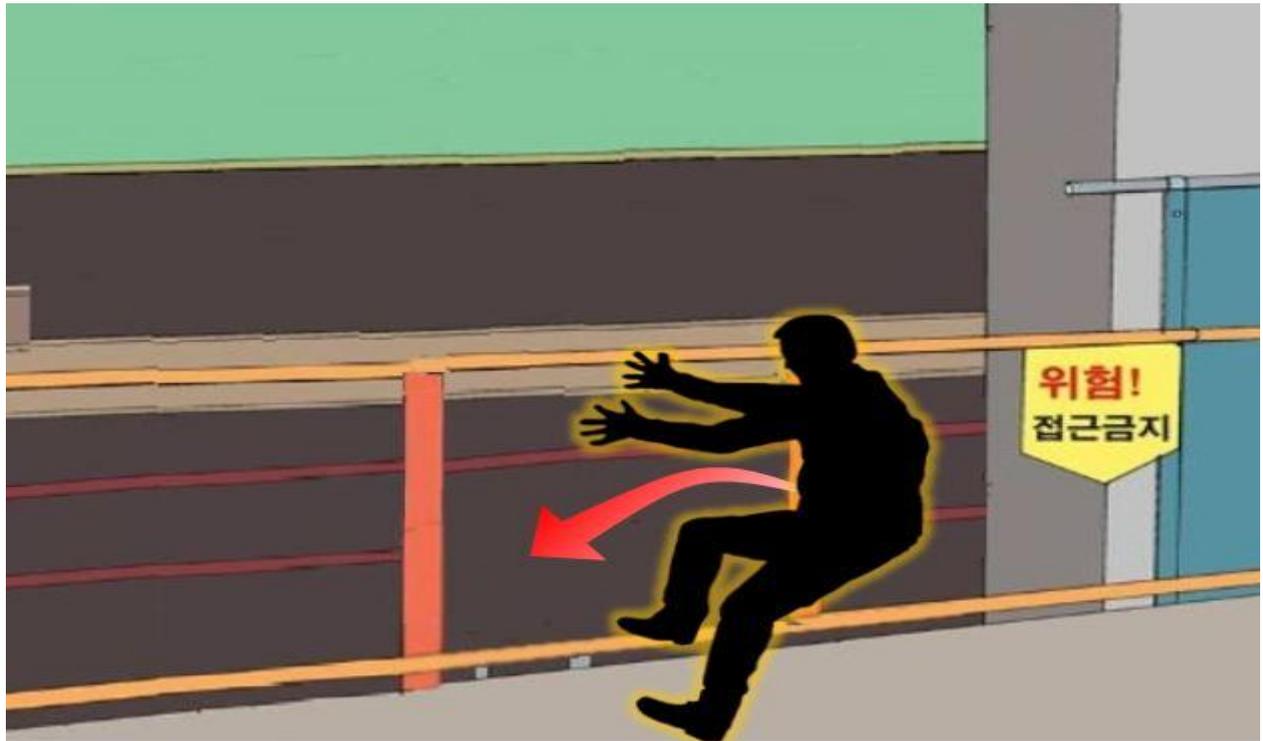

예방대책



- 자재 운반작업 시 적합한 운반보조 기계·기구등을 사용하고, 작업 시 주의사항(안정한 자세, 중량물 투척 금지 등)을 교육 후 기준에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 21일 16:40

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 19일(수) 13:30경 전남 완도군 소재 학교 보강 공사 현장에서 재해자가 **이동식비계에 올라 시멘트 타설 작업 중 1.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망**

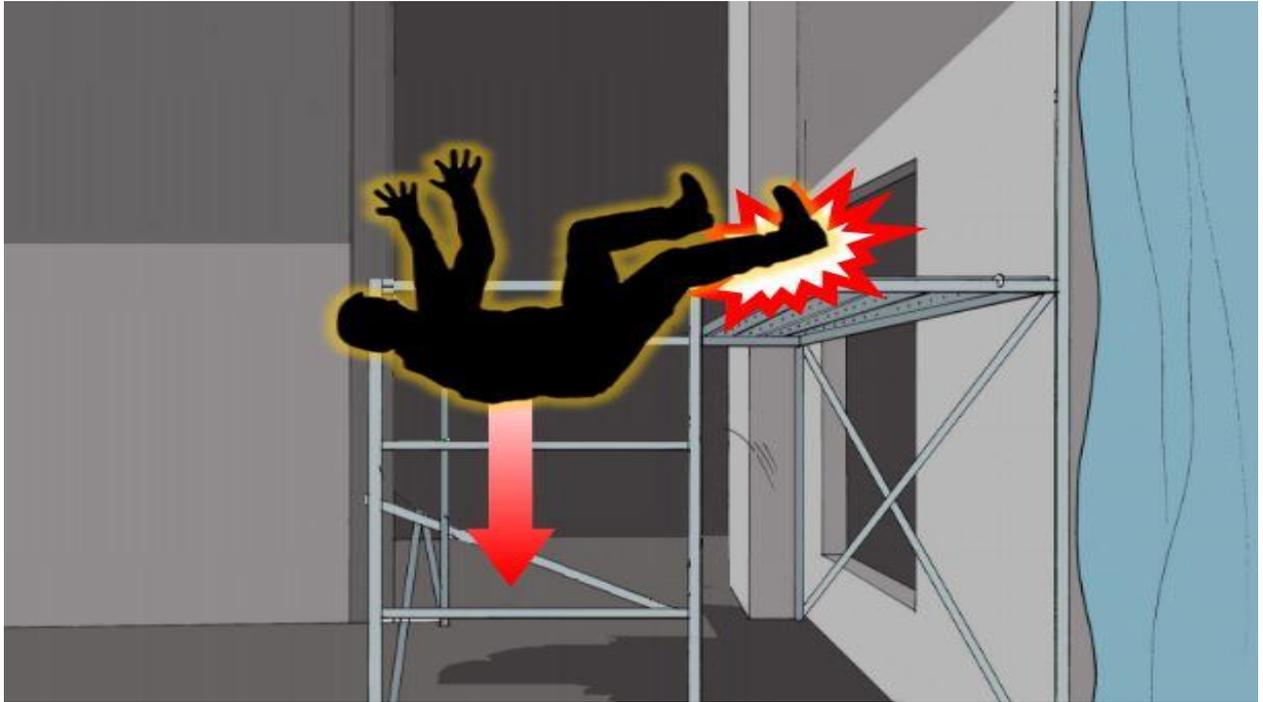

예방대책



- 비계 최상부에서 작업 시 비계 상부에 안전난간을 설치합니다.
- 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 24일 16:30

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 21일(금) 12:50경 전북 장수군 소재
축사 지붕에서 재해자가 채광창 교체 준비를 위해
이동 중 밟고 있는 **채광창이 파손되며 5.8m 아래
바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인합니다.
- 지붕 위에서 작업을 하는 경우 작업통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 2월 25일 16:30

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 24일(월) 07:50경 서울 영등포구 소재 체육시설 건축공사 현장에서 재해자가 **비계 해체 작업 중 8.3m 아래 바닥으로 떨어져 사망**

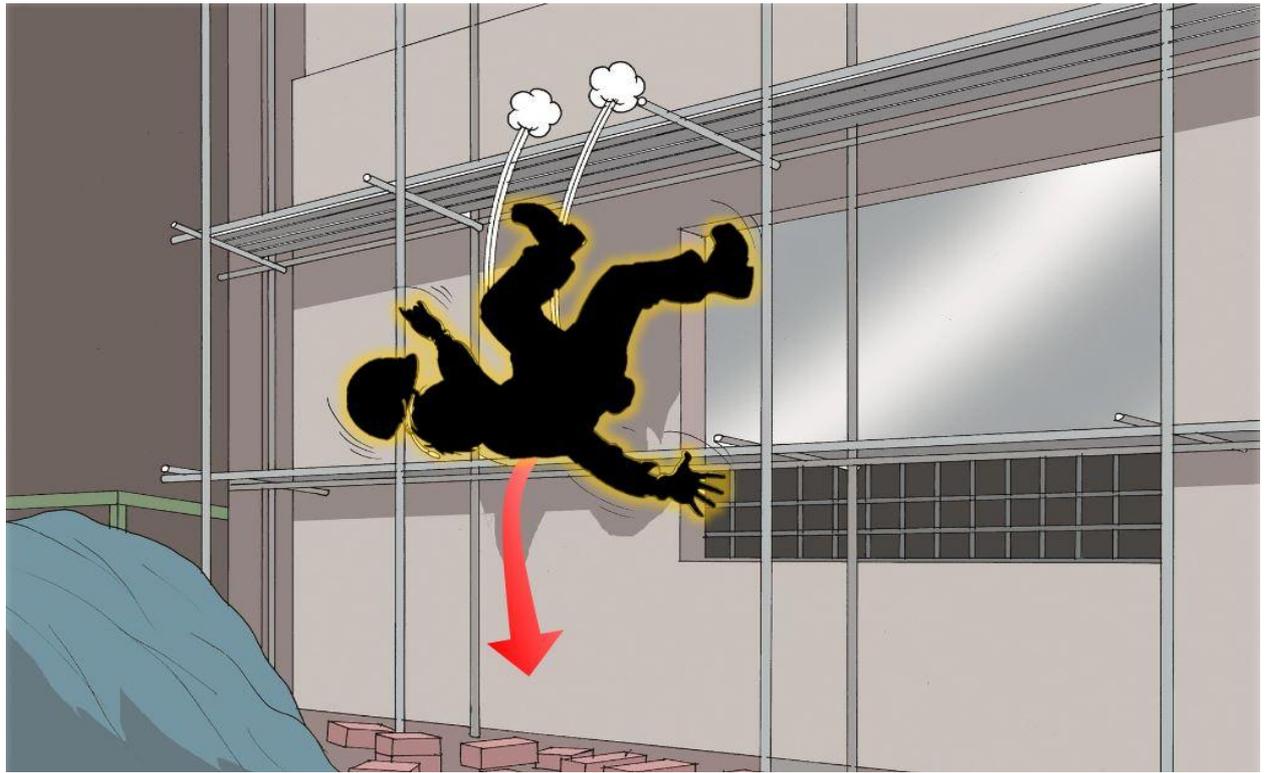

예방대책



- 안전대를 착용·체결하도록 관리감독을 철저히 합니다.
- 비계 해체 시기·범위 및 절차를 근로자에게 교육하고, 관리감독자의 지휘에 따라 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 25일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 24일(월) 07:51경 서울 강남구 소재 빌딩 설비 복구 공사 현장에서 재해자가 **이동 중 개구부(8.3m)로 떨어져 사망**



예방대책



- 근로자가 추락할 위험이 있는 개구부 등에는 안전난간 또는 수직형 추락방망, 덮개 등을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 2월 27일 15:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'25년 2월 6일(목) 11:31경 경남 거제시 소재 주택 신축공사 현장에서 재해자가 **데크플레이트 설치 중 2층 바닥(3.5m)으로 떨어져 치료 중 사망**



예방대책



- 철골 상부에서 작업을 하는 경우 추락방지망, 안전대 걸이시설 등을 설치하는 등 추락방호조치를 실시합니다.
