

[동종업 타사 중대재해 발생알림]

롯데건설 인천 복합시설현장 가시설 해체중 추락 件

안전기획팀
'23.07.11. 17:00

□ **시공사** : (주)롯데건설 (2022년 시공능력평가 순위 8위, 중처법 시행 후 5번째, 금년 3번째)


□ **현장개요**

- 현 장 명 : 인천터미널 복합개발 현장(인천광역시 미추홀구 관교동, 판매, 운수, 업무시설 증축)
- 공사금액 : 1,208 억원
- 공사기간 : 2022년 11월 09일 ~ 2024년 09월 30일(공정율 22%)

□ **재해내용**

'23.07.11(화) 복공판 하부 흙막이 4단 버팀대 브레이싱 해체 작업 중 5m 높이(지하 3층 → 4층)에서 떨어져 사망 (안전대 착용 및 침줄 안전고리 체결하였으나 안전대 가슴부위 버클이 파단되어 추락)

□ **재해사진**

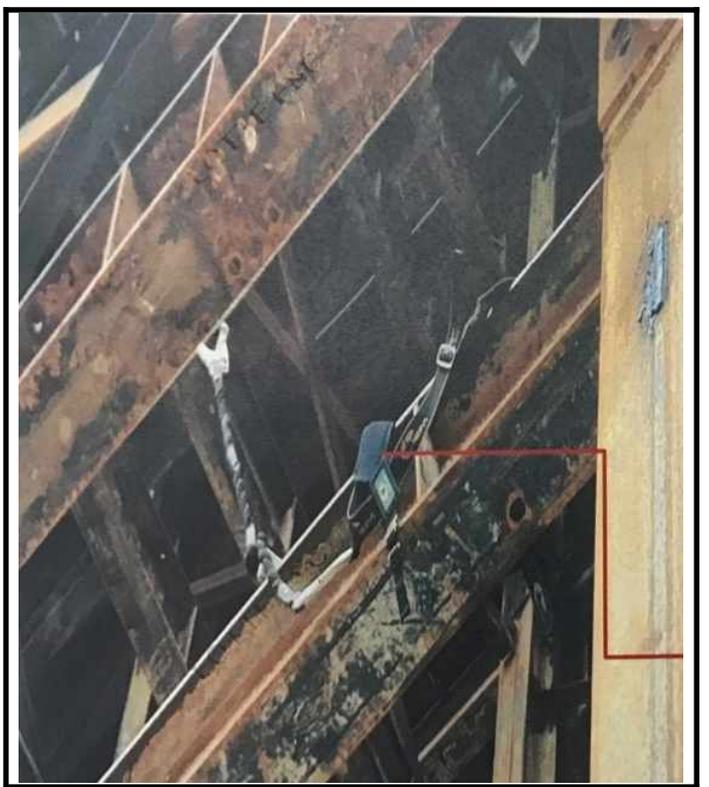

□ **피해상황**


- ▷ 인적피해 : 1명 사망

□ **사고원인 추정**

- ▷ 우천으로 미끄러운 H-PILE 가시설 상부 작업 및 추락시 충격하중으로 안전벨트 가슴 버클 파단/풀림
- ▷ 고용노동부 및 경찰 조사 진행중

□ **당사 현장 조치사항**

- ▷ 재해사례 전파
- ▷ 우천시 가시설 상부 고소작업 지양, 고소 작업전 안전벨트 주요 부위(버클, 카라비너, D링, 벨트 재봉부 등) 이상 여부 확인 및 필요시 교체
- ▷ 안전벨트 착용시 본인 신체에 맞게 적정 착용 여부 확인(허리벨트 등 주요 구조부 제거 금지)
- ▷ 상기 재해사례를 반영하여 작업순서 및 방법의 적정성을 검토하고 대책 수립 후 시행 확인

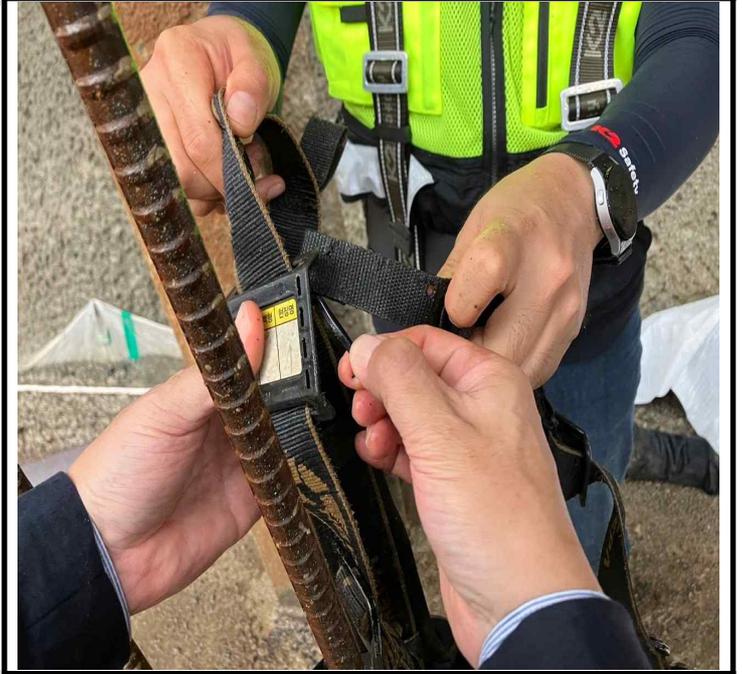

NEPA SAFETY BELT

3D AIR MESH
3D 에어메쉬

MULTI POCKET
무전기 주머니

SIZE - STRAP
사이즈 조절 웹빙

ORGANIZER POCKET
다용도 수납 주머니

CHEST - BELT
가슴 버클

AL - HOOK
알루미늄 훅

ONE TOUCH BUCKLE
알루미늄 원터치 버클

HARNES - STRAP
하네스 웹빙



■ 언론 보도자료(비즈니스 포스트 외)

기업과산업

Business Post

대형건설사 인천 공사현장에서 노동자 추락사, 고용부 중대재해법 여부 조사

류근영 기자 rky@businesspost.co.kr | 입력 : 2023-07-11 20:12:26

[비즈니스포스트] 롯데건설 공사현장에서 일하던 60세 노동자가 숨지는 사고가 벌어졌다.

11일 고용노동부에 따르면 이날 오전 8시경 인천 미추홀구의 인천 터미널 복합개발 공사현장에서 하청노동자 A씨(1963년생)가 약 5m 높이에서 떨어져 사망했다.



▲ 롯데건설 공사현장에서 일하던 60세 노동자가 숨지는 사고가 벌어짐에 따라 고용노동부가 중대재해처벌법 적용 여부 조사에 나섰다.

A씨는 지하주차장에서 철골해체 작업을 하며 철골 위에서 이동하다 지하 3층에서 지하 4층으로 떨어져 사망했다.

고용부는 사고원인을 파악하고 산업안전보건법과 중대재해처벌법 등의 위반 여부를 조사하는 방침을 세웠다.

사고가 발생한 롯데건설 공사현장은 공사금액 50억 원 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상이다.

중대재해처벌법은 공사금액이 50억 원 이상이거나 상시 노동자 50인 이상인 사업장에서 사망 등 중대재해가 발생하면 안전관리의무를 위반한 사업주 또는 경영책임자를 처벌할 수 있도록 규정하고 있다.

롯데건설 사업장에서 발생한 사망사고는 올해 들어 이번이 세 번째다.

5월 서울 아파트 재건축 현장에서 노동자 1명이 추락해 숨지는 사고가 있었다. 2월에도 서울의 한 공사현장에서 노동자 1명이 장비에 부딪혀 사망했다. 류근영 기자
